
案件名	糸島　大信薬局新築工事

開始日	終了日	作成日
2026/11/11	2027/04/16	2026/11/14

※進捗工事 11/11～11/13 実施済、個別・残土搬出 11/14～ を先行し、残打ち 11/30～12/17（確定）、個別土は下段の土地に仮置きして埋戻しに再利用、工種名の左の（-）で日程を折りたためます。

工種・作業	開始日	終了日	期間	担当・業者
■ 中間（個別中間）	**2026/11/25**	**2026/12/28**	**24日**	
確認申請 提出	2026/11/25	2026/11/25	1日	屋戸／設計
審査期間（約5か月）	2026/11/25	2026/12/28	34日(暦)	指定確認検査機関
確認済証 交付（予定）	2026/12/28	2026/12/28	1日	指定確認検査機関
■ 準備工事【実施済】	**2026/11/11**	**2026/11/13**	**3日**	
準備工事（境界確認・丁張・入電協議 ほか）	2026/11/11	2026/11/13	3日	屋戸
■ 掘削・個別工事	**2026/11/16**	**2026/11/27**	**9日**	
電柱まわり 養生・九電立会（矢板なし）	2026/11/16	2026/11/16	1日	土工／九州電力
A4個別 カッター・撤去	2026/11/16	2026/11/16	1日	土工
既存ブロック解体（基礎共）	2026/11/16	2026/11/17	2日	解体業者
A4個 掘削／ガラ山積み仮置場へ（A1台→B1減）	2026/11/17	2026/11/18	2日	解体業者
根切り（西→北→東）	2026/11/17	2026/11/26	7日	土工
隣地土 仮置き（下段の土地）	2026/11/17	2026/11/26	7日	土工
残土処分 現場→処理場（計44台）	2026/11/17	2026/11/26	7日	土工（ダンプ）
【A4】ガラ 個別掘出（小割り 150～150mm）	2026/11/18	2026/11/19	2日	自社職人
浴槽土・改良機 作業床整地	2026/11/27	2026/11/27	1日	土工／地盤改良業者
■ 地盤改良工事（個打ち）	**2026/11/27**	**2026/12/24**	**20日**	
杭芯出し（改良体3203本）	2026/11/27	2026/11/27	1日	屋戸／地盤改良業者
個別改良 φ500×2200本【施工】	2026/11/30	2026/12/17	14日	地盤改良業者
改良発生土 搬出・処分（14台）	2026/12/01	2026/12/17	13日	地盤改良業者
改良体 強度確認（7日強度）	2026/12/24	2026/12/24	1日	地盤改良業者
■ 砕石・捨てコン工事	**2026/12/18**	**2026/12/24**	**5日**	
杭頭処理・床付け確認	2026/12/18	2026/12/18	1日	土工
基礎砕石 敷き・転圧 t100	2026/12/21	2026/12/22	2日	土工
捨てコン（均し コン18）打設 5.6m³	2026/12/23	2026/12/23	1日	生コン・土工
墨出し（底盤）	2026/12/24	2026/12/24	1日	屋戸
■ 型枠工事	**2026/12/25**	**2027/02/08**	**29日**	
ベース型枠 組立（外周・妻・EJ・前面しかし外枠）	2026/12/25	2026/12/28	2日	型枠業者
補強筋 型枠（S-07）	2027/01/13	2027/01/13	1日	型枠業者
墨出し（立上り）	2027/01/18	2027/01/18	1日	屋戸
ベース型枠 解体	2027/01/19	2027/01/19	1日	型枠業者
立上り 外側型枠 建込み	2027/01/22	2027/01/22	1日	型枠業者
水抜VP75・目地棒・セパ・タコン 取付	2027/01/25	2027/01/25	1日	型枠業者
立上り 内側型枠（還し）建込み・締付け	2027/01/26	2027/01/26	1日	型枠業者
型枠検査・天端レベル・通り確認	2027/01/27	2027/01/27	1日	屋戸
脱型・型枠搬出	2027/02/05	2027/02/08	2日	型枠業者
タコン処理・外面シーリング	2027/02/08	2027/02/08	1日	型枠業者
■ 鉄筋工事	**2027/01/05**	**2027/01/22**	**13日**	
鉄筋 搬入（加工済）	2027/01/05	2027/01/05	1日	鉄筋業者
ベース配筋（底盤主筋F1・F2・配力筋F3）	2027/01/06	2027/01/07	2日	鉄筋業者
立上り縦筋 先組み（W1・W2）	2027/01/08	2027/01/08	1日	鉄筋業者
開口補強筋（R2・R3・R4・Rfa・R2a）	2027/01/12	2027/01/12	1日	鉄筋業者
配筋検査（構造設計者確認）	2027/01/14	2027/01/14	1日	屋戸／設計者
立上り配筋（横筋・巾止め・天端補助筋・ハンチ・端部）	2027/01/20	2027/01/21	2日	鉄筋業者
立上り 配筋確認	2027/01/22	2027/01/22	1日	屋戸
■ 生コン（コンクリート）工事	**2027/01/15**	**2027/02/09**	**18日**	
ベースコンクリート打設 57.8m³	2027/01/15	2027/01/15	1日	生コン・ポンプ
養生（底盤）	2027/01/16	2027/01/18	3日(暦)	—
立上りコンクリート打設 17.5m³	2027/01/28	2027/01/28	1日	生コン・ポンプ
養生（型枠存置）	2027/01/29	2027/02/04	7日(暦)	—
土木コンクリート打設 0.72m³	2027/02/09	2027/02/09	1日	生コン・土工
■ 埋戻し工事	**2027/02/09**	**2027/02/22**	**9日**	
事前A4処理・透水シート・【A1】ガラ到着の再はぎ取	2027/02/09	2027/02/10	2日	土工
埋戻し・転圧 北面（建物側を先行）	2027/02/12	2027/02/16	3日	土工
仮置き土の戻し（下段の土地→現場）	2027/02/12	2027/02/18	5日	土工
埋戻し・転圧 西面・東面	2027/02/17	2027/02/18	2日	土工
前面（北側）高上げ盛土・転圧	2027/02/19	2027/02/19	1日	土工
場内整地・下段の土地の復旧	2027/02/22	2027/02/22	1日	土工
■ 外部給排水工事	**2027/02/24**	**2027/03/04**	**7日**	
外部給排水工事	2027/02/24	2027/03/04	7日	設備業者
■ 建築工事	**2027/02/17**	**2027/04/16**	**41日**	
仮設電気工事	2027/02/17	2027/02/18	2日	屋戸
基礎工事	2027/02/17	2027/03/08	13日	屋戸
設備工事（先行配管）	2027/03/04	2027/03/09	4日	屋戸
土台引き	2027/03/09	2027/03/09	1日	屋戸
大工工事	2027/03/09	2027/03/29	14日	屋戸
足場工事	2027/03/10	2027/03/24	10日	屋戸
上棟	2027/03/11	2027/03/11	1日	屋戸
屋根工事	2027/03/12	2027/03/15	2日	屋戸
電気工事	2027/03/15	2027/03/17	3日	屋戸
外壁工事	2027/03/16	2027/03/18	3日	屋戸
外構工事	2027/03/25	2027/04/12	13日	屋戸
クロス工事	2027/03/30	2027/04/01	3日	屋戸
床貼り工事	2027/04/01	2027/04/02	2日	屋戸
照明器具取付工事	2027/04/05	2027/04/05	1日	屋戸
住設工事	2027/04/06	2027/04/08	3日	屋戸
完了検査（建築）	2027/04/13	2027/04/13	1日	指定確認検査機関
クリーニング・手直し	2027/04/14	2027/04/15	2日	屋戸
引渡し	2027/04/16	2027/04/16	1日	屋戸

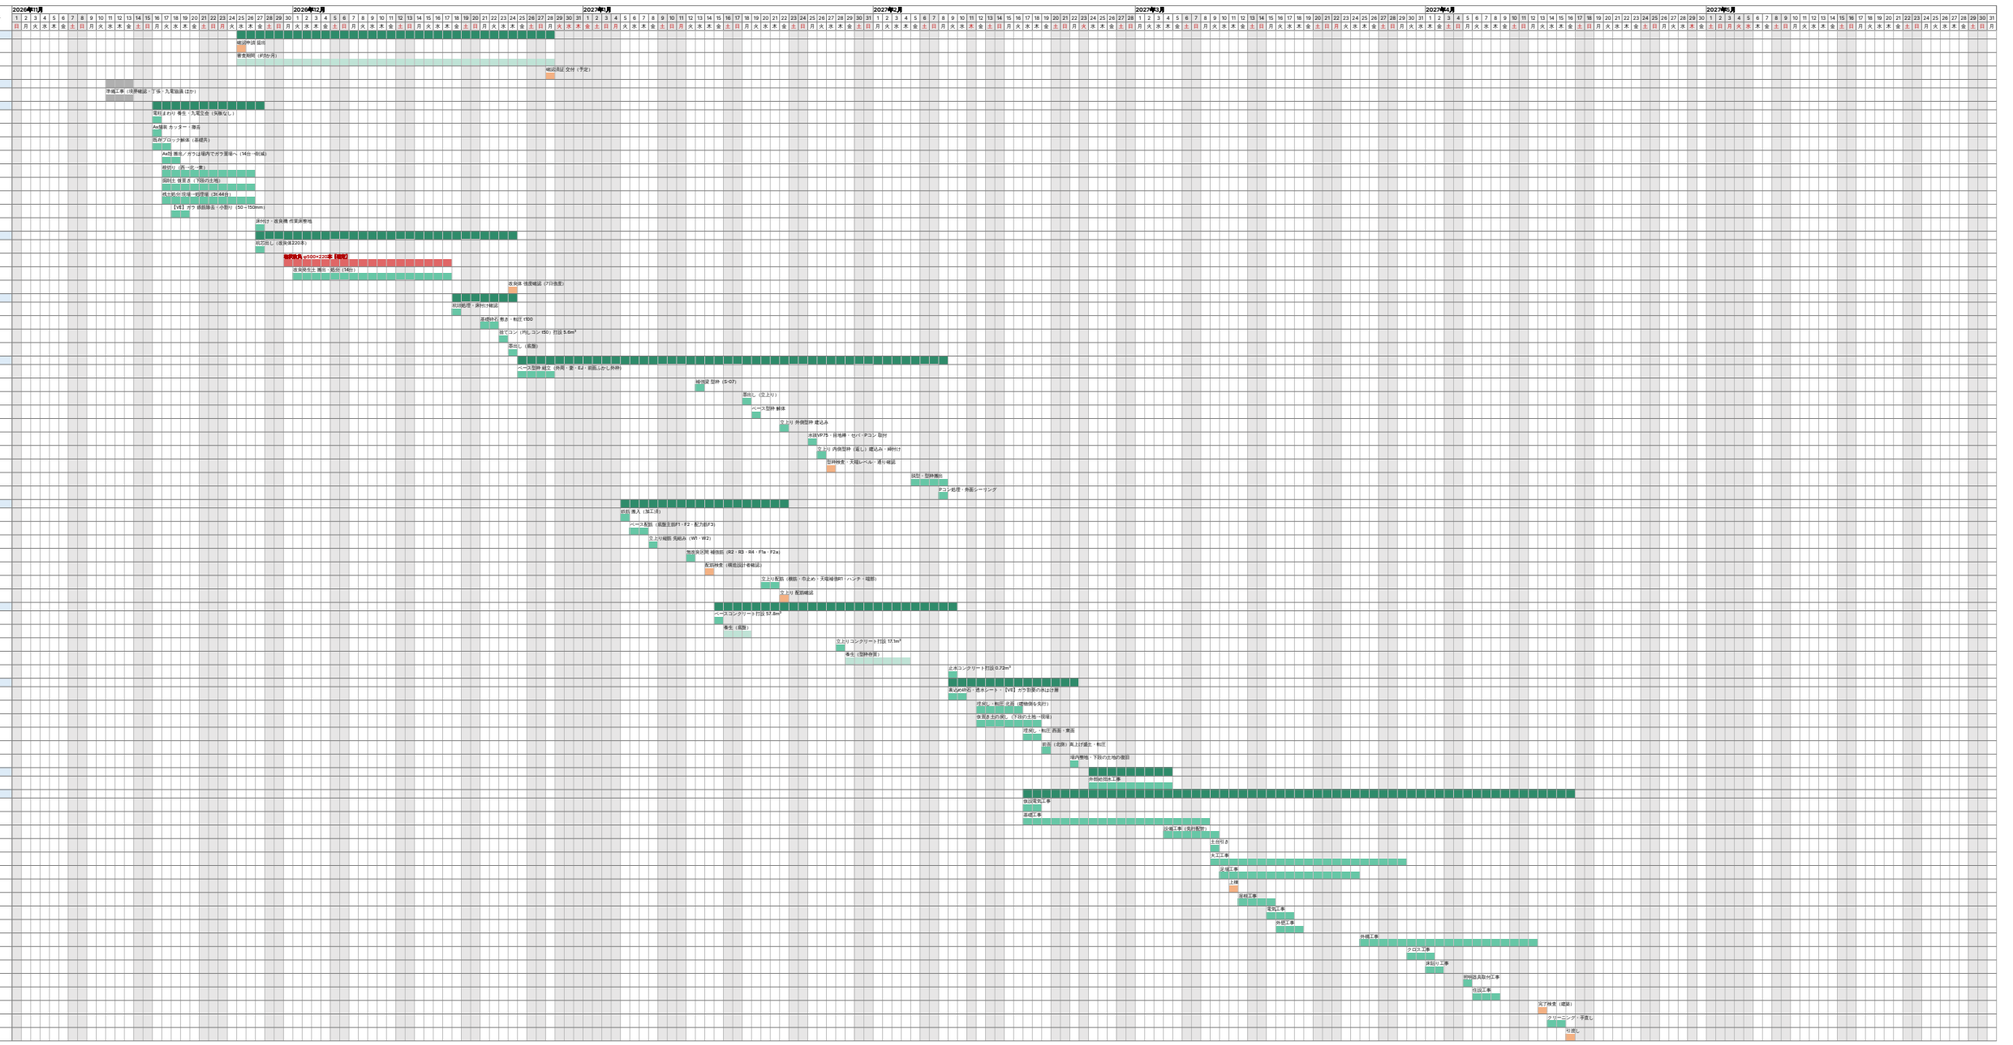

凡例　工種（配下の作業の期間）　作業（月～金、土日祝・年末年始休み）　確定工程（前打ち）　養生（暦日）　確認・検査　実施済

※作業名のセルにメモ（コメント）で数量・条件を記載。開始日・終了日を書き換えるとバーと期間が追従します（作業名の表示位置は固定）。

数量サマリー（数量計算シートを参照）

生コン 合計	81.3	m³
底盤打設（底盤＋補強筋＋ふかし）	57.8	m³
立上り打設	17.1	m³
捨てコン	5.6	m³
砕石（底盤の敷）	21.1	m³
鉄筋（概算）	297.7	m³
下段の土地に仮置き→埋戻し（ほぐし）	270.6	m³
土の総仕事（ほぐし）	114.1	m³
ガラ・As殻（ほぐし）	26.0	m³
タンク 現場→処分場	44	台

数量計算書（大信薬局様邸 擁壁工事 改3-1）

青字＝入力値（変更可）、黒字＝計算式。形状の値は擁壁施工図 改3-1 の平面形状から算出。数量はすべて概算。

1. 基本寸法（施工図 改3-1より）

項目	数量	単位	計算式	根拠・備考
底盤面積	106.15	m²	入力値	S-01 平面形状から算出（底盤幅3.0m、西面9.90＋北面25.46＋東面7.12、隅角部の重なり控除）
底盤厚	0.50	m	入力値	S-02
立上り平面積	10.47	m²	入力値	S-01 平面形状から算出（壁厚0.25m×延長）
ハンチ平面積（NW・NE隅）	0.24	m²	入力値	S-03 ハンチ500×500 二等辺三角形×2か所
立上り高さ	1.60	m	入力値	底盤天 ±0-1400 ～ 天端 ±0+200（S-02）
立上りのうち現況GL以下の高さ	1.40	m	入力値	底盤天 -1400 ～ ±0
北面延長	25.46	m	入力値	S-01
立上り内面延長	41.30	m	入力値	S-01 平面形状から算出（裏込め・止水コンの延長）
補強梁（上がり梁）長さ	6.00	m	入力値	S-07（NW隅から0.5～6.5m）

2. 生コンクリート

項目	数量	単位	計算式	根拠・備考
底盤 Fc21	53.08	m³	［A_F］*［T_F］	底盤面積 × 底盤厚
補強梁 上がり部 Fc21	1.50	m³	0.5*0.5*［EB_L］	幅0.5 × 上がり0.5 × 長さ（底盤内の部分は底盤に含む）
前面ふかしコン 無筋 Fc18	3.27	m³	0.3*0.4*(［L_N］+1.5+0.3)	幅0.3 × 高さ0.4（底盤下端-1900～-1500）×（北面＋西面NW隅1.5m＋隅部0.3）
底盤打設 合計（1回目）	57.85	m³	［V_F］+［V_EB］+［V_FK］	底盤＋補強梁＋前面ふかしコンを同日打設
立上り Fc21（ハンチ含む）	17.13	m³	(［A_W］+［A_H］)*［H_W］	（立上り平面積＋ハンチ平面積）× 高さ1.6
捨てコン（均しコン）t50	5.57	m³	［A_F］*1.05*0.05	底盤面積 × 1.05（敷地側100出し）× 0.05
止水コンクリート 350×50	0.72	m³	［L_IW］*0.35*0.05	立上り内面延長 × 0.35 × 0.05
生コン 合計	81.28	m³	［V_BASE］+［V_W］+［V_LEV］+［V_SUI］	発注は各回＋ロス約5%で手配

3. 砕石

項目	数量	単位	計算式	根拠・備考
基礎砕石 t100（RC-40）	11.15	m³	［A_F］*1.05*0.1	底盤面積 × 1.05 × 0.10（締固め後）
裏込め砕石 W300（単粒度）	9.91	m³	［L_IW］*0.3*0.8	立上り内面延長 × 幅0.3 × 高さ0.8（-300～-1100）
砕石 合計（締固め後）	21.06	m³	［G_B］+［G_U］	搬入量は締固め分 約1.2倍を見込む
砕石 搬入量（ほぐし）	25.27	m³	［G_ALL］*1.2	締固め後 × 1.2

4. 掘削（根切り）

項目	数量	単位	計算式	根拠・備考
現況GL（平均）	0.05	m	入力値	配置図の現況高 +50～+100（±0基準）
根切り底	-2.05	m	入力値	底盤下 -1900 − 捨てコン0.05 − 砕石0.10
掘削深さ（敷地側）	2.10	m	［GL］-［BOT］	現況GL − 根切り底
掘削底面積（敷地側：外面～底盤端＋作業幅0.5）	119.70	m²	入力値	S-01 平面形状から算出（外面から敷地側へ3.5m）
掘削上端面積（法勾配1:0.5）	144.31	m²	入力値	S-01 平面形状から算出（外面から敷地側へ 3.5＋0.5×2.10＝4.55m）
掘削 敷地側（地山）	277.21	m³	(［A_B］+［A_T］)/2*［DEP］	（底面積＋上端面積）÷2 × 深さ（平均断面法）
掘削 外側作業帯 西面（地山）	10.40	m³	0.5*9.9*［DEP］	幅0.5 × 西面9.90 × 深さ（帯状部は現況GL）
掘削 外側作業帯 北面（地山）	4.96	m³	0.5*［L_N］*(-1.66-［BOT］)	幅0.5 × 北面 × 深さ（外部地盤-1660～根切り底）
掘削 外側作業帯 東面（地山）	5.09	m³	0.5*7.12*(-0.62-［BOT］)	幅0.5 × 東面7.12 × 深さ（外部地盤 平均-620～根切り底）
掘削土量 合計（地山）	297.66	m³	［V_IN］+［V_OW］+［V_ON］+［V_OE］	

5. 埋戻し・残土

項目	数量	単位	計算式	根拠・備考
土量変化率 L（ほぐし）	1.20		入力値	砂質土の一般値。土質により見直し
土量変化率 C（締固め）	0.90		入力値	砂質土の一般値。土質により見直し
掘削内に入る構造物等	100.19	m³	［G_B］+［V_LEV］+［V_F］+［V_EB］+［V_FK］+［V_W］*［H_WB］/［H_W］+［G_U］+［V_SUI］	基礎砕石＋捨てコン＋底盤＋補強梁＋ふかしコン＋立上り（GL以下）＋裏込め砕石＋止水コン
埋戻し量（締固め後）	197.47	m³	［V_EX］-［V_DIS］	掘削量 − 構造物等
前面（北側）嵩上げ盛土（締固め後）	5.50	m³	0.17*1.2*(［L_N］+1.5)	平均0.17 × 幅約1.2 ×（北面＋西面1.5m）（S-05）
埋戻し・盛土 合計（締固め後）	202.97	m³	［V_BF］+［V_MO］	
再利用する土（地山換算）	225.52	m³	［V_FILL］/［K_C］	締固め後 ÷ C
下段の土地へ仮置きする土（ほぐし）	270.62	m³	［V_RE］*［K_L］	再利用分 × L → 下段の土地（隣接）に仮置きし、埋戻し時に戻す
残土（地山）	72.14	m³	［V_EX］-［V_RE］	掘削量 − 再利用分
残土 処分量（ほぐし）	86.57	m³	［V_SUR］*［K_L］	残土（地山）× L → 処分場へ直送
改良体 総長	779.25	m	70*3.85+89*3.6+49*3.35+12*2.1	コラム伏図：3.85m×70本＋3.60m×89本＋3.35m×49本＋2.10m×12本
改良体 体積	153.01	m³	［N_COL］*PI()*0.25^2	総長 × φ500の断面積（無改良区間の減少分は未控除）
改良発生土の率	0.15		入力値	仮定値。改良業者に確認
改良発生土 処分量（ほぐし）	27.54	m³	［V_COL］*［R_COL］*［K_L］	改良体体積 × 発生率 × L（杭工事期間中に処分）

土の処分量 合計（ほぐし）	114.11	m³	［V_SURL］＋［V_COLS］	残土＋改良発生土

6. 産業廃棄物（解体）

項目	数量	単位	計算式	根拠・備考
既存ブロック 延長	45.00	m	入力値	北・東面（仮定値。現地で確認）
ブロック・基礎 体積	9.05	m³	［CB_L］*(0.8*0.12+0.35*0.3)	延長 ×（高さ0.8×厚0.12 ＋ 基礎0.35×0.3）※仮定寸法
アスファルト殻 体積	8.31	m³	(［A_T］+21.8)*0.05	（掘削上端面積＋外側作業帯21.8m²）× 厚0.05
ガラ・As殻 処分量（ほぐし）	26.03	m³	(［V_CB］＋［V_AS］)*1.5	体積 × ほぐし率1.5（コンクリート殻の一般値）

7. 運搬計画（3tダンプ 2台ピストン・11/14 指示）

項目	数量	単位	計算式	根拠・備考
3tダンプ 1台の積載量（ほぐし）	2.00	m³/台	入力値	3t ÷ ほぐし土の単位体積重量 約1.5t/m³
ダンプ台数	2	台	入力値	3tダンプ2台でピストン運転（11/14 指示）
1日の稼働時間	420	分	入力値	8:00～17:00 から休憩・段取りを除く7時間
下段の土地 往復＋積込時間	15	分	入力値	隣接する下段の土地。仮定値
処理場 往復＋積込時間	55	分	入力値	往復45分（11/14 指示）＋積込10分
処分費（3t 1台あたり）	5,000	円/台	入力値	11/14 指示
ダンプ1台日（運転手・燃料）	30,000	円/台日	入力値	仮定値。自社ダンプ・自社の運転手なら実費に置き換え
現場→下段の土地 台数	136	台	ROUNDUP(［V_YARD］/［Q_T］,0)	
現場→処理場 台数（残土）	44	台	ROUNDUP(［V_SURL］/［Q_T］,0)	
改良発生土 台数	14	台	ROUNDUP(［V_COLS］/［Q_T］,0)	杭工事期間中
ガラ・コンガラ 台数	14	台	ROUNDUP(［V_GARA］/［Q_T］,0)	解体期間中（産廃は処分単価が別）
下段の土地→現場 台数（埋戻し）	136	台	［T_Y］	仮置きした土を全量戻す
1台の1日あたり往復回数（処理場）	7	回/日	INT(［HR］/［RT_D］)	稼働時間 ÷ 往復＋積込
残土搬出 日数	4	日	ROUNDUP(［T_D］/(［N_D］*［N_RT］),0)	台数 ÷（ダンプ台数×往復回数）
残土 処分費＋運搬費	460,000	円	［T_D］*［P_D］＋［D_D］*［N_D］*［C_DAY］	台数×処分費 ＋ 日数×ダンプ台数×1台日
残土 1m³あたり（ほぐし）	5,314	円/m³	［C_SUR］/［V_SURL］	予算書の単価として使用
改良発生土 搬出 日数	1	日	ROUNDUP(［T_C］/(［N_D］*［N_RT］),0)	
改良発生土 処分費＋運搬費	130,000	円	［T_C］*［P_D］＋［D_C］*［N_D］*［C_DAY］	
改良発生土 1m³あたり（ほぐし）	4,720	円/m³	［C_COL］/［V_COLS］	予算書の単価として使用

根切り・搬出 日数	7	日	MAX(ROUNDUP(［T_Y］/(［N_D］*INT(［HR］/［RT_Y］))+［T_D］/(［N_D］*［N_RT］),0),ROUNDUP(［V_EX］/45,0))	運搬日数と掘削能力（約45m³/日：ミニ～小型バックホウ・岩あり）の大きい方
埋戻し（戻し・転圧）日数	5	日	MAX(ROUNDUP(［T_B］/(［N_D］*INT(［HR］/［RT_Y］)),0),ROUNDUP(［V_FILL］/45,0))	運搬日数と転圧能力（約45m³/日・30cm毎）の大きい方

式の［キー］は同じシートの数量欄を指します（例：［A_ト］＝底盤面積）。キー一覧：A_ト=底盤面積、I_ト=底盤厚、A_W=立上り半面積、A_H=ハンチ半面積（NW・NE隅）、H_W=立上り高さ、H_WB=立上りのうち現況GL以下の高さ、L_N=北面延長、L_IW=立上り内面延長、LB_L=補強梁（上がり梁）長さ、V_F=底盤 Fc21、V_EB=補強梁 上がり部 Fc21、V_FK=前面ふかしコン 無筋 Fc18、V_BASE=底盤打設 合計（1回目）、V_W=立上り Fc21（ハンチ含む）、V_LEV=捨てコン（均しコン）t50、V_SUI=止水コンクリート 350×50、V_RC=生コン 合計、G_B=基礎砕石 t100（RC-40）、G_U=裏込め砕石 W300（単粒度）、G_ALL=砕石 合計（締固め後）、G_IN=砕石 搬入量（ほぐし）、GL=現況GL（平均）、BOT=根切り底、DEP=掘削深さ（敷地側）、A_B=掘削底面積（敷地側：外面～底盤端＋作業幅0.5）、A_T=掘削上端面積（法勾配1:0.5）、V_IN=掘削 敷地側（地山）、V_OW=掘削 外側作業帯 西面（地山）、V_ON=掘削 外側作業帯 北面（地山）、V_OE=掘削 外側作業帯 東面（地山）、V_EX=掘削土量 合計（地山）、K_L=土量変化率 L（ほぐし）、K_C=土量変化率 C（締固め）、V_DIS=掘削内に入る構造物等、V_BF=埋戻し量（締固め後）、V_MO=前面（北側）嵩上げ盛土（締固め後）、V_FILL=埋戻し・盛土 合計（締固め後）、V_RE=再利用する土（地山換算）、V_YARD=下段の土地へ仮置きする土（ほぐし）、V_SUR=残土（地山）、V_SURL=残土 処分量（ほぐし）、N_COL=改良体 総長、V_COL=改良体 体積、R_COL=改良発生土の率、V_COLS=改良発生土 処分量（ほぐし）、V_SOIL=土の処分量 合計（ほぐし）、CB_L=既存ブロック 延長、V_CB=ブロック・基礎 体積、V_AS=アスファルト殻 体積、V_GARA=ガラ・As殻 処分量（ほぐし）、Q_T=3tダンプ 1台の積載量（ほぐし）、N_D=ダンプ台数、HR=1日の稼働時間、RT_Y=下段の土地 往復＋積込時間、RT_D=処理場 往復＋積込時間、P_D=処分費（3t 1台あたり）、C_DAY=ダンプ1台日（運転手・燃料）、T_Y=現場→下段の土地 台数、T_D=現場→処理場 台数（残土）、T_C=改良発生土 台数、T_G=ガラ・コンガラ 台数、T_B=下段の土地→現場 台数（埋戻し）、N_RT=1台の1日あたり往復回数（処理場）、D_D=残土搬出 日数、C_SUR=残土 処分費＋運搬費、U_SUR=残土 1m³あたり（ほぐし）、D_C=改良発生土 搬出 日数、C_COL=改良発生土 処分費＋運搬費、U_COL=改良発生土 1m³あたり（ほぐし）、D_EX=根切り・搬出 日数、D_BF=埋戻し（戻し・転圧）日数

工程作成の条件・前提（2026/11/13 作成）

確定条件	杭打ち（柱状改良 φ500×220本）11/30～12/17。準備工事 11/11～11/13 は実施済。これ以外は計画値。
作業日	月～金。土日・祝日・年末年始（12/29～1/4）は休み（元工程表の日数の数え方に合わせた）。雨天予備日は含まない。
施工順序	準備 → 解体・掘削・残土搬出（11/16～、杭打ち前に完了）→ 杭打ち → 杭頭処理 → 砕石・捨てコン → 底盤（型枠→鉄筋→生コン）→ 立上り（鉄筋→型枠→生コン）→ 埋戻し。改良機の施工基面（掘削底）と空掘長
鉄筋・型枠・生コン	同じ部位では重ねない（ラップしない）。底盤と立上りは1回ずつ一括打設（工区分けなし）。
既存ブロック解体	北・東面の既存CB 約45m（基礎共）を杭工事前に撤去（改良体の外周列が外面から約0.25mにあり干渉）。西面の旧ブロックは帯状部の土留めとして残す想定（要確認）。
掘削土の扱い	埋戻しに使う土は隣接する下段の土地に仮置きし、埋戻し時に戻す（場外運搬なし）。掘削 約297.7m³（地山）、仮置き 約270.6m³（ほぐし）。
残土処分	残土 約86.6m³（ほぐし）＝44台を処分場へ直送。改良発生土 約27.5m³（14台、発生率は仮定）を合わせた土の処分量 約114.1m³。別にガラ・As殻 約26.0m³（14台）。
数量の根拠	「数量計算」シートに入力値と計算式を記載。ダンプ台数・往復時間・土量変化率を変えると台数と日数が再計算される（工程表の日付は自動では変わらない）。
改良体の強度	杭打ち完了の翌作業日に杭頭処理。7日強度の結果（12/24頃）を確認してから底盤を打設（1/14）。
型枠存置	底盤：打設後3日（暦日）で立上り作業。立上り：冬期のため7日（暦日）存置後に脱枠。
電柱・電線	九電の防護管取付・電柱位置実測を最初に実施。電柱周り1.0mは掘削・資材仮置きをしない（矢板は使わない）。電線下は小旋回機で作業高さ制限、監視人配置。ポンプ車は上空線にブームをかけない位置に据える（S-
無改良区間	西面 NW隅から0.7～5.0mは改良体なし。補強筋・補強梁（S-07）は構造設計者確認後に施工。配筋検査に1日を確保。
残土の残り	杭打ち開始（11/30）までに搬出しきれない残土は、場内に仮置き土とともに置き、後日処分する。
年末年始	12/28にベース型枠まで進めて休み（12/29～1/4）。休暇中は掘削部・型枠をバリケード・ネット・シートで養生。
建築工事	元の工程表の各工事の日数はそのまま使い、順序を組み直した。基礎工事は北面の埋戻し完了後に着手（北面ヒールと建物が重なるため）。外構工事は足場解体・外部給排水の完了後に内装と並行。最後に完了検査・ク

確認申請	11/25 提出、約1か月の審査で12月末に確認済証交付の見込み。建物の基礎着手は2月中旬のため、交付が遅れても約7週間の余裕がある。
結果	擁壁埋戻し完了 2027/02/22（元工程 2027/01/29）、全体完了 2027/04/16（元工程 外構 2027/04/14）。

休日一覧（期間の計算に使用）

2026/11/23	勤労感謝の日
2026/12/29	年末年始休暇
2026/12/30	年末年始休暇
2026/12/31	年末年始休暇
2027/01/01	年末年始休暇
2027/01/02	年末年始休暇
2027/01/03	年末年始休暇
2027/01/04	年末年始休暇
2027/01/11	成人の日
2027/02/11	建国記念の日
2027/02/23	天皇誕生日
2027/03/22	春分の日 振替休日
2027/04/29	昭和の日
2027/05/03	憲法記念日
2027/05/04	みどりの日
2027/05/05	こどもの日

工程の実現性・余裕度チェック（2026/11/14）

余裕＝計画日の翌日から期限（最終許容日）までの作業日数（月～金、祝日・年末年始を除く）。◎10日以上／○5日以上／△1日以上／余裕0＝遅れがそのまま後ろへ響く（クリティカル）。雨天中止日は工程に含めていない。

確認ポイント	計画日	限（最終許容日	裕（作業日）	評価	根拠・リスク	対策
掘削・残土搬出の完了 → 杭打ち開始	2026/11/26	2026/11/27	1	△	根切り7日を11/17～11/26で実施。11/27は床付け・杭芯出し。	雨で遅れた残土は場内に仮置き土とともに置き、杭打ち後に処分（指示どおり）。11/21（土）を予備日にできるよう業者と調整。
確認済証の交付 → 建物の基礎着手	2026/12/28	2027/02/16	29	◎	審査約1か月で12月末交付の見込み。基礎着手は2月中旬。	審査の質疑は早めに回答。交付が1月にずれても建物工程への影響はない。
改良体の7日強度 → 底盤打設	2026/12/24	2027/01/14	9	○	最後の改良体の7日強度は12/24。底盤打設は1/15。	試験結果を年内に受領しておく。
S-07 補強の構造確認 → 無改良区間の配筋	2026/12/25	2027/01/08	5	○	構造設計者の確認を年内に得る前提。	未了だと配筋検査・底盤打設が止まる。11月中に構造設計者へ依頼する。
北面の埋戻し完了 → 基礎着手	2027/02/16	2027/02/16	0	余裕0	北面を先に埋め戻し、翌作業日から基礎。ここが全体の要（クリティカル）。	立上りを早強セメントにすると型枠存置を約3日短縮でき、余裕が増える。
内装・外構の完了 → 完了検査	2027/04/12	2027/04/12	0	余裕0	外構工事が内装より4日遅く、外構が最後の工程になる。	外構は足場解体の翌日から着手。駐車場以外を先行するなど分割すれば短縮できる。
引渡し → 4月末	2027/04/16	2027/04/30	9	○	引渡し 4/16 計画。4/30まで作業日9日の余裕。	雨天見込み（下記）を差し引くと余裕はほぼない。週次で進捗を確認し、遅れは土曜作業で取り戻す。

雨天リスクの見込み

区間	見込み（作業日）	考え方
擁壁工事（12/18～2/22、作業日 約40日）	5	冬期の福岡は1か月に約10日の降水日。土工・打設・型枠建込みが止まる日を約5日と見込む。
建物の外部工事（上棟～外構、作業日 約25日）	3	上棟・屋根・外壁・外構が雨の影響を受ける。約3日と見込む。
雨天見込み 合計	**8**	
引渡しまでの余裕 − 雨天見込み	**1**	0以上なら4月末に間に合う見込み。マイナスなら土曜作業・早強セメント・外構の分割で取り戻す。

総合評価

4月末完了は実現可能。ただし余裕は作業日9日で、雨天見込み約8日を差し引くと約1日しかない。クリティカルは「掘削（杭打ち前）」「北面埋戻し → 基礎」「外構」の3点。
余裕を増やす手段：①立上りに早強セメント（約3日）②外構の分割着手（約3～4日）③遅れた週は土曜作業。①②を採用すると余裕は約15日になる。
