大信薬局 糸島店 新築工事　工程表（予定）

作成日 2026年11月14日　ハゼモト建設株式会社

天候・検査日程などにより前後する場合があります。日程が変わる際は改めてご連絡いたします。

工事項目	開始	完了
■ 擁壁・造成工事		
準備工事（実施済）	11/11	11/13
既存ブロック撤去・掘削・残土搬出	11/16	11/27
地盤改良工事	11/30	12/17
擁壁工事（基礎・コンクリート打設）	12/18	2/9
埋戻し	2/9	2/22
■ 建物工事		
外部給排水工事	2/24	3/4
基礎工事	2/24	3/12
上棟	3/17	3/17
屋根・外壁工事	3/18	3/25
大工工事	3/16	4/5
設備・電気工事	3/10	3/24
内装工事（クロス・床・照明・住設）	4/6	4/16
外構工事	4/19	5/11

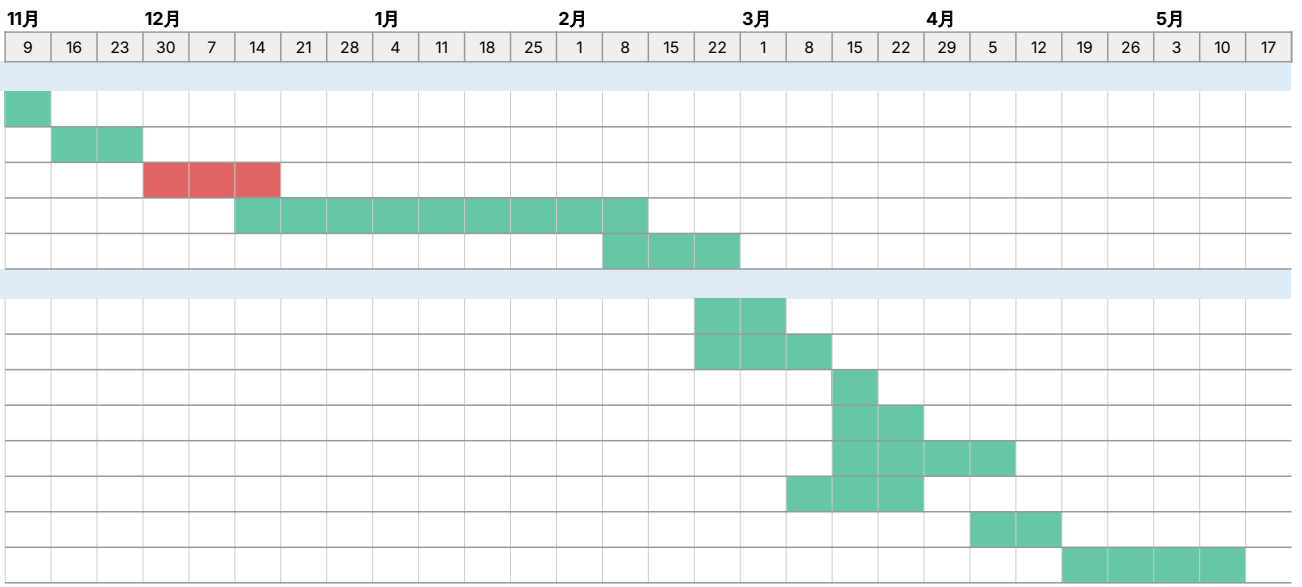

完成予定　5月11日（予定）

※準備工事（11/11～11/13）は実施済、地盤改良工事（11/30～12/17）は確定日程です。それ以外は予定です。

※擁壁工事は、敷地北西の電柱・電線を避けるため西側の擁壁位置を敷地内側へ移す計画としています。

※年末年始（12/29～1/4）は工事をお休みします。

※建物工事の日程は、擁壁工事の進み具合に合わせて調整いたします。
