作業指示書 No.1　既存ブロック塀の解体

大信薬局様邸新築工事（糸島・擁壁工事）　第3版

指示：櫨本　現場責任者：粟戸　2026/11/14

作業者サイン：＿＿＿＿＿＿　＿＿＿＿＿＿

北面・東面の既存ブロック塀を基礎まで撤去する。西面の旧ブロックは残す。分別を徹底し、ガラは指示書No.4へ。

① 解体範囲（平面）



解体する（北面・東面 約45m、基礎まで）


残す（西面の旧ブロック＝帯状部の土留め）

電柱の周り1.0m：近づかない（No.2）

新しい擁壁の位置（参考）

道路

② ブロック塀（断面）と解体の順番

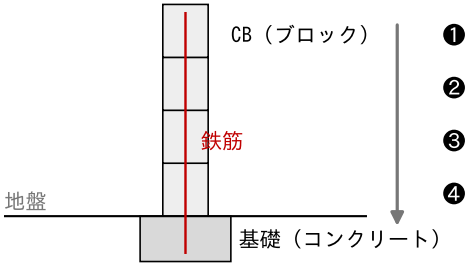

❶ 上の段から順に崩す

❷ 鉄筋はカッターで切って抜く

❸ 基礎まで掘り起こして撤去

❹ 跡は平らにならす

③ 手順

1. カラーコーン・トラロープで作業範囲を囲う（道路側・隣地側）
2. 境界杭の位置を確認し、印をつける（壊さない・動かさない）
3. 隣地・道路側へ倒さない。敷地内側へ崩す（ミニバックホウのつかみ）
4. 基礎まで撤去する（新しい改良体の外周に当たるため）
5. 分別して、それぞれの置場へ（下の表）
6. 解体前・途中・後の写真を撮る（同じ位置から）

○ 分別して置く

- CB・基礎 → ガラ置場（No.4）
- 鉄筋・金物 → 金属くず（売却）
- 土 → 下段の土地（No.3）

× しないこと

- ガラと土を混ぜて出す
- ガラを埋める・土に混ぜる
- 草木・ゴミをガラに混ぜる
- 西面の旧ブロックを壊す

※ 解体したブロック・基礎の量（m³・台数）を日報に記入する。

★大事：使うのは この「第3版（2026/11/14）」と 図面「改3-2」だけ。古い紙（第1版・第2版・改3-1）は すぐに捨てる。分からないときは 粟戸さんに聞く。

作業指示書 No.2　電柱の養生と、電柱まわりの掘削


指示：櫨本　現場責任者：粟戸　2026/11/14

大信薬局様邸新築工事（糸島・擁壁工事）　第3版

作業者サイン：＿＿＿＿＿＿　＿＿＿＿＿＿


矢板は使わない。電柱の根元に近いため、分割して掘り、毎日傾きを確認する。異常があれば直ちに中止して埋め戻す。

① 平面（電柱まわり）

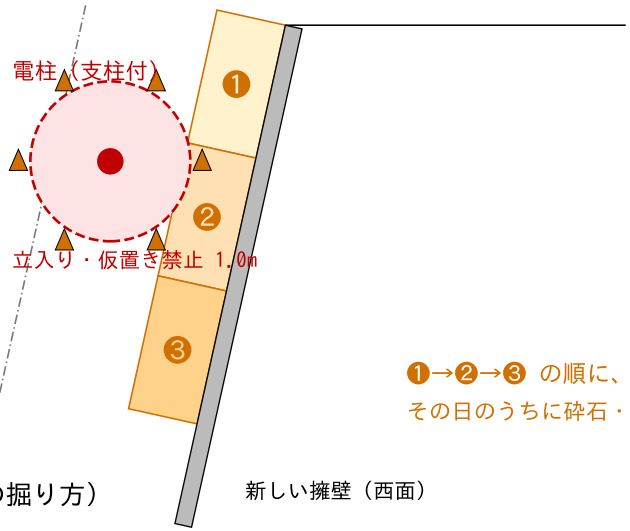

❶→❷→❸ の順に、長さ2mずつ掘る
その日のうちに砕石・捨てコンまで

② 断面（電柱側の掘り方）

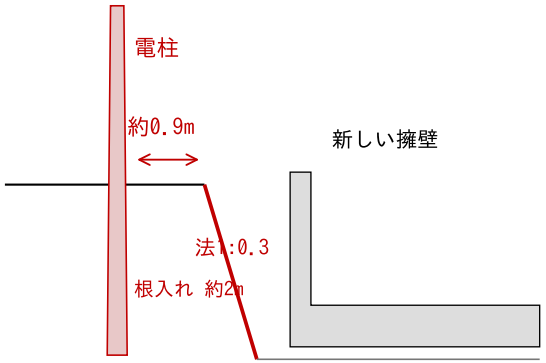

③ 手順

1. 掘る前に九電へ連絡し、立会いの日を決める（立会いなしで掘らない）
2. 電柱の周り1.0mをカラーコーン6本＋トラロープで囲う
3. 下げ振りを電柱の2方向（北・東）に設置し、印をつける
4. ❶❷❸の順に2mずつ掘る。法面は1:0.3、作業幅0.3m
5. 掘ったその日に砕石・捨てコンまで。夜は法面をシートで覆う
6. 雨の日・雨の翌日は電柱側を掘らない

○ してよい

- コーン・ロープの内側は手作業のみ
- 重機は電柱から離れて作業
- 異常は粟戸さん→九電へすぐ連絡

× してはいけない

- 電柱周り1.0mに重機・ダンプ・資材を置く
- 支柱の足元を掘る・踏む
- 電線の下で重機のアームを高く上げる
- まとめて長く掘る（2m超）

④ 傾きの確認（朝・昼・夕に記入）

日付	時刻	北方向のずれ(mm)	東方向のずれ(mm)	確認者

前回から5mm以上、または合計10mm以上ずれたら → すぐ掘削を止めて埋め戻し、九電へ連絡
亀裂・湧水・電柱まわりの地面の沈みが出たときも同じ

★大事：使うのは この「第3版（2026/11/14）」と 図面「改3-2」だけ。古い紙（第1版・第2版・改3-1）は すぐに捨てる。分からないときは 粟戸さんに聞く。

作業指示書 No.3　残土の処分と仮置き（3tダンプ）

指示：櫨本　現場責任者：栗戸　2026/11/14

大信薬局様邸新築工事（糸島・擁壁工事）　第3版

作業者サイン：＿＿＿＿＿＿　＿＿＿＿＿＿

処理場へ出すのは合計41台まで。41台に達したら、残りは全部「下段の土地」へ仮置き（埋戻しに使う）。

① 掘った物の行き先

掘削
（ミニバックホウ）
掘りながら分ける

杭打ち（11/30〜）で出る
改良発生土（セメント混じり）
は別の山。土に混ぜない

処理場（3tダンプ）合計41台まで

最初に出る表層の土：土間コン下の砕石・ガラ混じり土、泥状の土、草や根の多い土

下段の土地へ仮置き（良質土の山）

41台を超えた分は全部ここ。普通の土（砂質土・真砂土）＝埋戻しに使う

岩の山（割栗石）3t 16台分まで

握りこぶしより大きい石・岩。埋戻しの下層に再利用。16台分を超えたら処理場へ（台数は別に記録）

ガラ置場（コンガラ・ブロック）

土間コン・ブロック・基礎のかけら → 指示書No.4（小割りして場内で再利用、処理場へは出さない）

② 処理場行きカウンター（1台ごとに1マス✓）

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40
41							

41台目（赤枠）で打ち止め → 以降は下段の土地へ

③ 目安

- 3tダンプ1台＝約2m³（山盛りにしない・シートを掛ける）
- 処理場まで往復45分。2台でピストン → 1日 約14台
- 処理場行き（土）41台 ≒ 3日。掘削は全部で約7日
- 下段の土地へは全部で 約135台分（約270m³）
- 岩の山は3t 16台分（約32m³）まで（ガラを先に使う）


○ してよい

- 処理場行きは台数を毎回記入
- 山は種類ごとに分けて看板を立てる
- 雨の前にシートを掛ける

× してはいけない

- 41台を超えて処理場へ出す
- 良質土を処理場へ出す
- 岩・ガラ・改良土を良質土に混ぜる

④ 下段の土地の仮置き（配置の例）

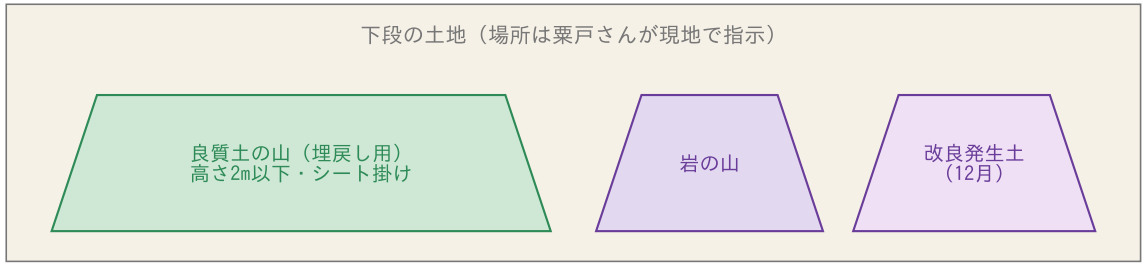

★大事：使うのは この「第3版（2026/11/14）」と 図面「改3-2」だけ。古い紙（第1版・第2版・改3-1）は すぐに捨てる。分からないときは 栗戸さんに聞く。

作業指示書 No.4　破壊コンクリート（土間コン・ブロック）の再利用

指示：櫨本　現場責任者：栗戸　2026/11/14

大信薬局様邸新築工事（糸島・擁壁工事）　第3版

作業者サイン：＿＿＿＿＿＿　＿＿＿＿＿＿

処分しない。鉄筋を外して割栗石の大きさ（50〜150mm）に小割りし、場内で使い切る。割らずに大きな塊のまま埋めるのは禁止。

① 流れ（クラッシャーは使わない）

ガラ置場 → 鉄筋を外す → 小割り → 割栗の山 → 使う

- **ガラ置場**：土間コン・ブロック・基礎のかけらを集める
- **鉄筋を外す**：カッターで切る 金属くずへ
- **小割り**：ブレーカー・バケットで 50〜150mm（最大200mm）
- **割栗の山**：下段の土地に置く 土と混ぜない
- **使う**：下の②の順に使う

② 使う場所（上から順に使う）

❶ 擁壁の裏の水はけ層（西面・東面）：裏込め砕石の外側に幅50cm
　透水シートを挟んで入れる（下の③の図）。約16m³

❷ 西面・東面のヒールの上の埋戻しの下の層（割栗石と同じ扱い）
　壁から0.8m以上離す。上の60cmは良い土だけ

❸ 帯状部（旧西面〜新西面）の盛土、北側の前面嵩上げの下の層

❹ 下段の土地・場内の仮設通路（ぬかるみ対策）

量の目安：ガラ 約29m³（土間コン約20＋ブロック・基礎約9）→ 処理場へ出すのは0を目指す


○ してよい

- 鉄筋・木・土・ゴミを取り除いてから使う
- 50〜150mm（最大200mm）に割る
- 1層30cm以下で敷き、すき間を土でうめて締める
- 使った場所と量を写真と日報に残す

× してはいけない

- 割らずに大きな塊のまま埋める（不法投棄）
- 鉄筋が付いたまま使う
- 裏込め砕石の代わりに入れる・壁に当てる
- 北面ヒールの上（建物の下）に使う

③ 擁壁の裏の水はけ層（断面）

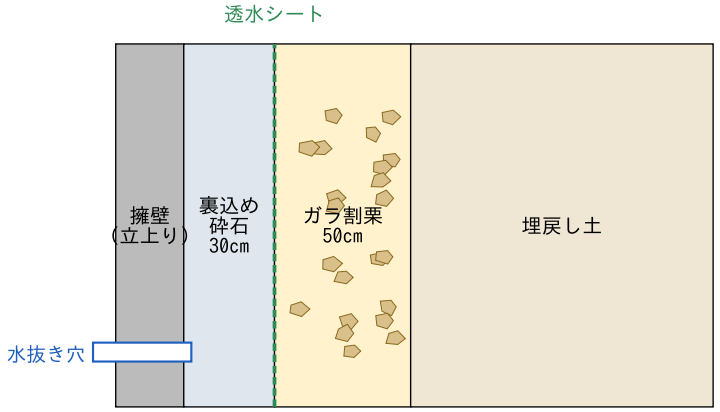

※ 壁と裏込め砕石には、ガラを当てない・混ぜない

※ ❶〜❸は構造設計者の承認後に行う（承認までは割栗の山に置いておく）。

※ 40mm以下に砕く必要はない（駐車場の路盤に使う場合だけ。今回は使わない）。

★大事：使うのは この「第3版（2026/11/14）」と 図面「改3-2」だけ。古い紙（第1版・第2版・改3-1）は すぐに捨てる。分からないときは 栗戸さんに聞く。
